


11月に入り、日に日に寒さが増しており冬の始まりを感じる季節となりました。

トンネル掘削は、1日に3m程度のペースで掘り進めており、10月末に約30m掘削完了しました。現在は午前8時、午後1時、午後7時30分を目安に発破掘削を行っておりますが、現場の状況によって変動しますことご了承ください。また、11月の中旬頃から1日に4回（午前午後2回ずつ）発破を行い、2026年3月末にトンネル掘削完了を目標として工事を進めてまいります。

地域の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、交通障害、騒音、振動、粉塵などの影響を最小限に抑えながら、工事関係者一同、周辺の皆さまの安全と安心を第一に細心の注意を払って作業を行いますので、今後とも、ご協力のほどよろしくお願い致します。

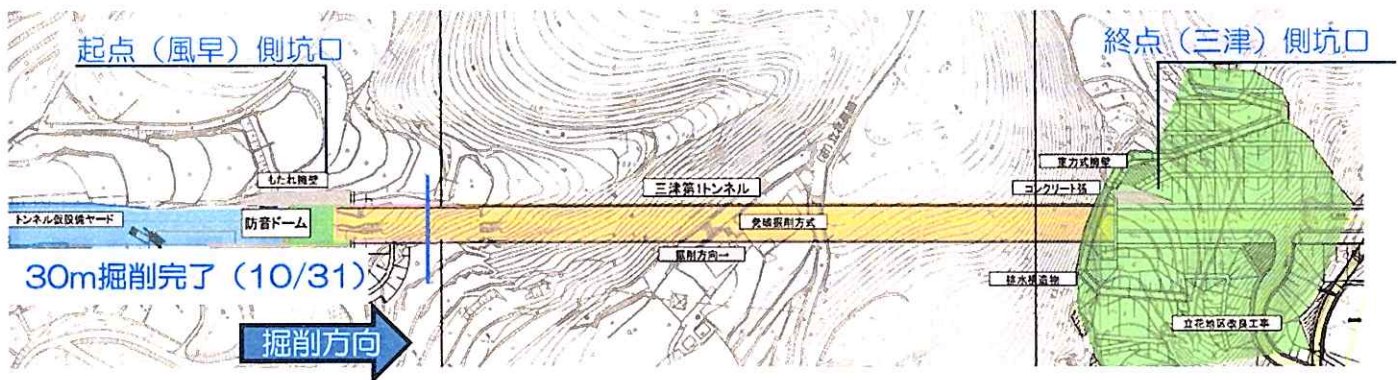

【工事用進入路】



【今後の地域活動】

- ・毎週金曜日の夕方に隣接工区の山陽工業と工事用進入路（上図緑線）の清掃を行います。
- ・11月22日（土）午前に安芸津バイパス協議会として地域の清掃活動を行います。
- ・随時、現場見学会を開催いたします。ぜひ、ご参加ください

【発破放送について】

発破作業のお知らせとして下図の看板を各所に設置しております。
期間、合図方法を記載しておりますのでご確認いただけると幸いです。

発破作業のお知らせ

この度、令和6年度安芸津バイパス 三津第1トンネル
工事のため、下記の要領にて発破作業を行いますので
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

尚、発破前にはサイレン及び拡声器にて予告致します。

期間 令和 7 年10月16日～令和 8 年 5 月31日

合図方法 拡声器とサイレン

発破 5 分前 ■■■ 長音断続

発破 1 分前 ■■■■■ 短音断続

10 秒 前 秒読み

発破終了 XXXXXXXXXX 長音連続



施工者 (株)大本組 三津第1トンネル作業所
所長 小西 秀治 TEL 0846-45-2930

※何かお気づきの点等がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

三津第1トンネル作業所
TEL : 0846-45-2930

【解注者】



国十交通省 中国地方整備局 広島国道事務所

【施工者】



大木組 株式会社大木組 広島支店
MOTO 三津第1トンネル作業所



「想い」を
築く仕事。
<https://www.ohmoto.co.jp>

