


師走の候、皆さまにおかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より工事にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

トンネル掘削は、1日に3～4m程度のペースで掘り進めており、12月15日時点で約124m掘削完了しました。先月同様1日に3～4回（午前1～2回、午後1～2回）を目安に発破掘削を行っておりますが、現場の状況によって変動しますことご了承ください。2026年3月末にトンネル掘削完了を目標として工事を進めてまいります。

また、今年の発破作業は12月19日をもって終了いたしました。新年の発破作業は2026年1月8日午前8時より行う予定です。なお、現場作業は2025年12月26日まで行います。

地域の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、交通障害、騒音、振動、粉塵などの影響を最小限に抑えながら、工事関係者一同、周辺の皆さまの安全と安心を第一に細心の注意を払って作業を行いますので、今後とも、ご協力のほどよろしくお願いします。

それでは、よいお年をお迎えください。

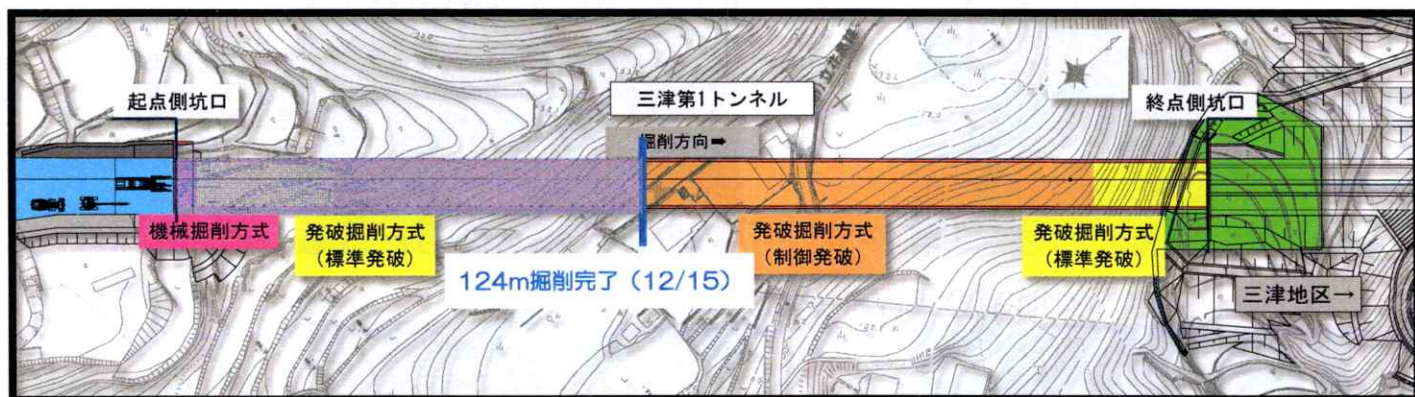

【お知らせ】

＜現場Instagram始動＞

QRコードをカメラで
読み取ることでフォロー
することができます。



令和6年度安芸津バイパス三津第1トンネル工事のInstagramを始めました！
トンネル工事の進捗や現場の様子をお届けいたします。

【今後の地域活動】

- ・毎週金曜日の夕方に隣接工区の山陽工業と工事用進入路の清掃を行います。



【工事状況】

＜現場の状況＞



トンネル坑口全景



トンネル坑内全景

＜安全祈願祭（10月7日）＞



天候にも恵まれ、地域の方も参加して頂き、無事開催することが出来ました。

＜地域清掃活動（11月22日）＞



いつもご迷惑をおかけしている工事現場周辺家屋の周りや工事車両進入道路を清掃いたしました。

＜地元住民向け現場見学会（12月16日）＞



地元の方を対象とした現場見学会を開催いたしました。100名を超える大勢の方に来ていただきました。

※何かお気づきの点等がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

三津第1トンネル作業所
 TEL：0846-45-2930

【発注者】



国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所

【施工者】



株式会社大本組 広島支店
 三津第1トンネル作業所



「想い」を
 築く仕事。
<https://www.ohmoto.co.jp/>

